

**VOORSTEL AB**

**CATEGORIE:** Bespreekstuk

**DATUM DB VERGADERING** : 6 februari 2018  
**DATUM AB VERGADERING** : 13 maart 2018  
**PORTEFEUILLEHOUDER** : H. Pereboom  
**REGISTRATIENUMMER** : Z/18/016536-75769  
**OPSTELLER** : Jaap Ruiter, 088 - 233 17 21

 ruw waterschap

**ONDERWERP**

Kredietaanvraag werkzaamheden Panjerd - Veeningen

**VOORSTEL**

Een aanvullende krediet verlenen van € 183.000 voor afronding van de werkzaamheden aan de waterberging Panjerd-Veeningen.

**SAMENVATTING**

Waterschap Reest en Wieden heeft langs de Hoogeveense Vaart tussen Meppel en Hoogeveen de waterberging Panjerd-Veeningen aangelegd. Deze voormalige zandwinlocatie is nu ingericht voor gestuurde waterberging. In een situatie dat wateroverlast dreigt, kan het gebied onder water gezet worden. Er kan ca. 800.000 m<sup>3</sup> water worden geborgen. Dit draagt bij aan verlaging van de waterstand en afvoer in de Hoogeveense Vaart en de stad Meppel.

De aanleg van de waterberging is grotendeels in 2016 afgerond. De aanleg van het laatste stukje kade en een doorvoer heeft lang gewacht op overeenstemming met een grondeigenaar. Nu deze overeenstemming is bereikt kan het werk worden afgerond. Daarvoor is aanvullende krediet nodig. Doordat er tevens een extra ZON-subsidie aan het project is toegekend, vallen de kapitaalslasten van deze investering per saldo lager uit dan in de meerjarenbegroting 2018-2021.

**BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN**

Het algemeen bestuur van waterschap Reest en Wieden heeft een uitvoeringskrediet verleend van € 2.770.000. Naar aanleiding van de 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2017 heeft u op 28 september 2017 het krediet verhoogd met € 257.000.

In het Klimaat en Energieprogramma van Drenthe is in 2009 een subsidiebedrag van € 580.000 toegekend aan het project waterberging Panjerd-Veeningen.

Bestuurlijk heeft de situatie langere tijd de aandacht gehad in verband met het bereiken van overeenstemming met de eigenaar van het perceel waarop het laatste stukje kade moet worden aangelegd. Na de aanvullende kredietverlening kunnen de werkzaamheden geheel worden afgerond en kan (nadat het nieuwe kade gedeelte is gezet) de berging ingezet worden als waterberging.

**OMGEVING EN PARTNERS**

Bij de start van deze afrondende werkzaamheden zullen zowel de eigenaar, stichting Het Drentse Landschap, alsmede de gebruiker (VOF Echten) worden geïnformeerd. Ook de direct aangeleggen bewoners zullen worden geïnformeerd.

Na afronding van deze werkzaamheden kan medio juni 2018 de waterberging officieel in gebruik worden genomen.

## FINANCIËN

De laatste ramingen laten zien dat de werkzaamheden niet binnen het verleende krediet kunnen worden uitgevoerd, en dat ook de MOR wordt overschreden. Om deze reden wordt dit voorstel tot verhoging van het krediet aan u voorgelegd. Zie de specificatie hieronder.

	Actuele kostenraming	Reeds verleend krediet	overschrijding
Uitgaven tot 31-12-2017	3.120.998		
Uit te voeren werkzaamheden 2018	135.000		
Dichten kade en aanbrengen doorvoer, communicatie, infobord, opening en test waterberging	30.000		
Bouwrente 2018 (6 maanden)	<u>24.012</u>		
Krediet	3.310.000	3.127.000	183.000
MOR 5%		0	0
		156.350	
Overschrijding MOR			26.650

Het benodigde aanvullende krediet is € 183.000. De extra kapitaallasten hiervan zijn € 10.700 per jaar. In het dagelijks bestuur is najaar 2017 besloten om de toegekende ZON subsidies 2016 te koppelen aan o.a. het project waterberging Panjerd - Veeningen voor een bedrag van € 310.500. Dit betekent een verlaging van de kapitaallasten voor dit project met € 18.000. Per saldo zullen de kapitaallasten van dit project derhalve dalen met € 7.300 (€10.700 - € 18.000) t.o.v. van de begroting en zullen vanaf 2019 worden meegenomen in de meerjarenbegroting 2019-2022.


## RISICO'S

Zolang het laatste stuk kade niet is aangelegd kan het bergingsgebied van 800.000m3 niet worden ingezet.

Het niet aanleggen van het gedeelte kade leidt tot niet gewenste imagoschade voor het waterschap.

## TOELICHTING

De waterberging (zie afbeelding) is voor het grootste deel in 2016 gerealiseerd.

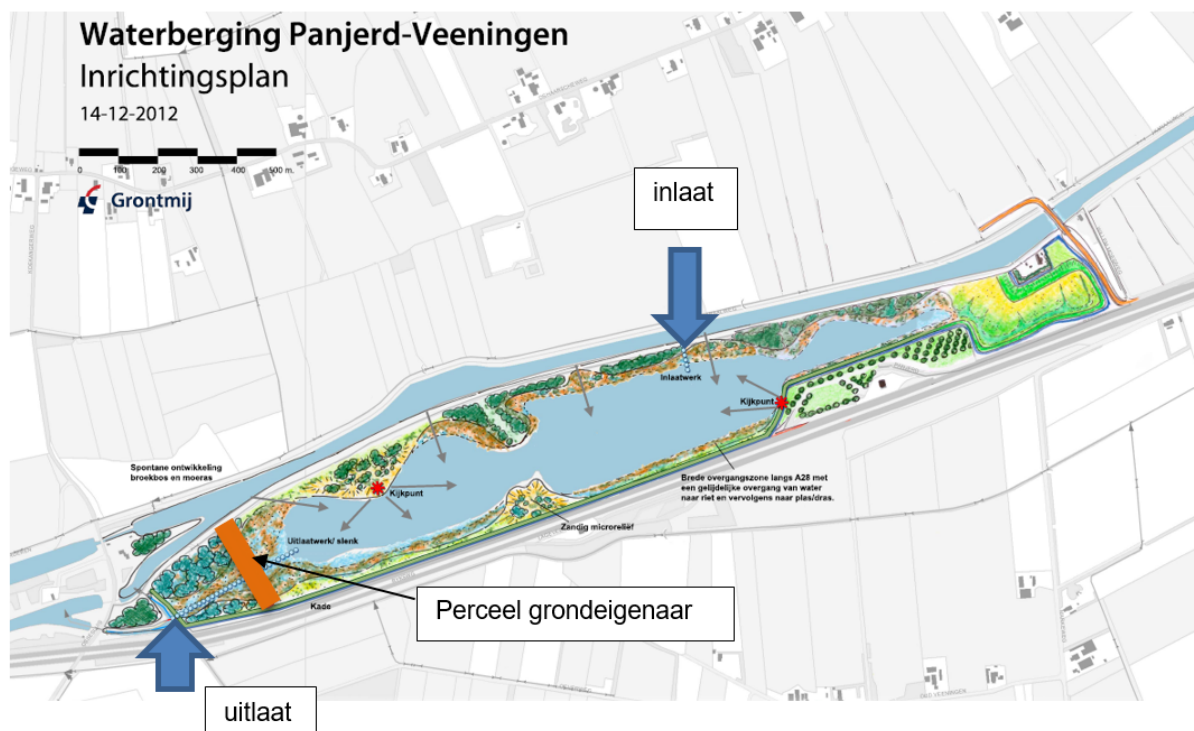

De uitzondering is het laatste stukje kade aan de zuidkant van het perceel dat hierboven is aangeduid met 'perceel grondeigenaar'. Dit kon niet worden aangelegd omdat er nog geen overeenstemming was eigenaar van het perceel. Na 2016 zijn de onderhandelingen doorgegaan. Tot voor kort leek het er niet op dat er overeenstemming zou komen en dat de kade d.m.v. een gedoogplicht gerealiseerd moest worden. Uiteindelijk hebben we alsnog het hele perceel in eigendom gekregen. Daardoor kunnen we nu conform het oorspronkelijke plan de werkzaamheden afronden. Des te eerder het kadegedeelte wordt aangelegd des te sneller de waterberging inzetbaar is.

Ten tijde van de tweede Bestuursrapportage gingen we er nog vanuit dat de gedoogconstructie zou worden toegepast. In die situatie zou het waterschap geen kosten hebben voor aanschaf van de grond. Nu alsnog overeenstemming is bereikt over aankoop zijn er wel aanschafkosten en kosten voor inrichting van een ruilperceel. Daarnaast blijkt dat bij de tweede Bestuursrapportage geen rekening is gehouden met de bouwrente die (intern) op het project wordt geboekt. Door de lange eigendomsdiscussie is die bouwrente fors opgelopen. Daarom is nu een verhoging van het krediet nodig om de berging af te kunnen ronden.

Bij de tweede Bestuursrapportage was ook nog niet bekend dat een ZON-subsidie aan het project kan worden toegerekend. Daardoor vallen de kapitaalslasten van deze investering per saldo lager uit dan in de meerjarenbegroting 2018-2021 is voorzien.

Afhankelijk van de weer- en terreinomstandigheden zullen de werkzaamheden worden ingepland en worden uitgevoerd. Vanwege het boetebeding moeten de werkzaamheden uiterlijk 1 juni 2018 gereed zijn. De inschatting is dat de werkzaamheden binnen 3 a 4 weken uitgevoerd kunnen worden.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,  
ir. E. de Kruijk

de dijkgraaf,  
ir. H.H.G. Dijk
